

BESCHLUSS

VOM 11. JULI 2024

GESCH.-NR. 2023-0492
BESCHLUSS-NR. 2024-147
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **06 Raumplanung, Bau und Verkehr**
06.05 Mobilität
06.05.01 Öffentlicher Verkehr
06.05.01.03 Bushaltestellen

BETRIFFT **Neubau Bushof, Effretikon;**
Genehmigung Projektorganisation

AUSGANGSLAGE


Im Zuge der Effretiker Zentrumsentwicklung investieren verschiedene private Grundeigentümerinnen und -eigentümer in neue Wohn- und Gewerbebauten. Parallel dazu sollen auch die öffentlichen Infrastrukturen mit den Neuerungen Schritt halten. Ein wesentliches Element dieser Planung bildet die Verlegung des Bushofs an einen für Umsteigefahrgäste geeigneteren Standort. Einerseits kann dadurch die Anzahl Haltekanten erhöht und andererseits können sie gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ausgebildet werden. So kann der neue Bushof die Funktion als Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs in Zukunft deutlich besser gewährleisten.

Das Stadtparlament genehmigte am 1. Februar 2024 den Projektierungskredit und den Gestaltungsplan für den Neubau des Bushofs auf Basis des Vorprojekts (STAPAB-Nrn. 2024-37 und 2024-42).

In der Zwischenzeit hat die Steuergruppe des Projekthandbuch überarbeitet. Mit der Auslösung der nächsten Planungsphase ist vorgesehen, die Zusammensetzung der Steuergruppe anzupassen. Zudem wurde insbesondere das Rahmenterminprogramm um die Aspekte Koordination Drittprojekte, Finanzierung und politischer Prozess erweitert. Die Steuergruppe gab das revidierte Projekthandbuch Version 2.3. am 28. Juni 2024 zur Kenntnisnahme an den Stadtrat frei. Gleichzeitig beantragt sie dem Stadtrat die Einsetzung der neu zusammengesetzten Steuergruppe.

ZUSAMMENSETZUNG STEUERGRUPPE AUF BASIS PROJEKTHANDBUCH AB PHASE 32, VERSION 2.2

Mit dem Wechsel zur SIA-Phase 32 (Bauprojekt) wird die Federführung des Projektes Neubau Bushof Effretikon von der Abteilung Hochbau, Stadtplanung, an die Abteilung Tiefbau übergeben. Dadurch verändern sich die Konstellationen im Projektteam (PT) und der Steuergruppe (SG). Weiter wurden Doppelfunktionen bereinigt, Personalwechsel bei den Fachplanern und Stakeholdern nachgeführt und Experten ergänzt.



BESCHLUSS

VOM 11. JULI 2024

GESCH.-NR. 2023-0492

BESCHLUSS-NR. 2024-147

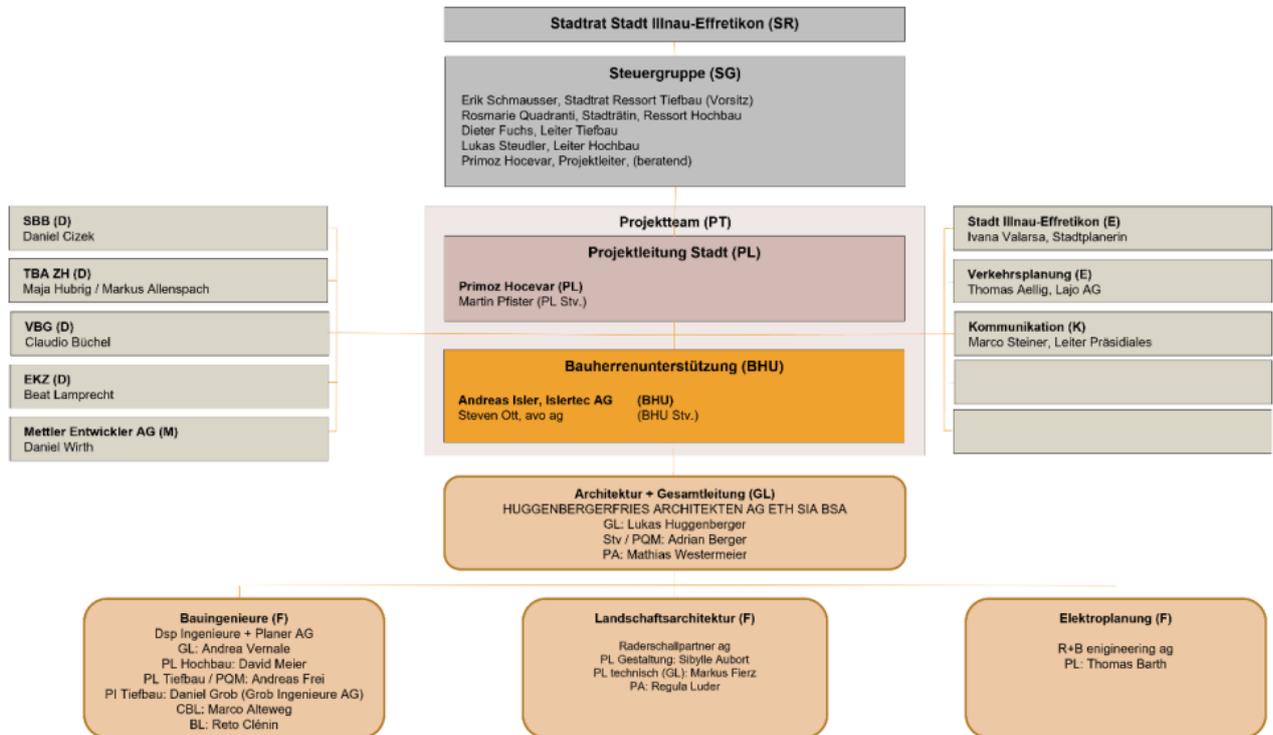


Abb. 1: Organigramm, SIA-Phasen 32 – 53 Bauprojekt – Ausführung (neu)

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON AUF ANTRAG DES RESSORTS TIEFBAU BESCHLIESST:

- Die Zusammensetzung der Steuergruppe für das Ausführungsprojekt Neubau Bushof wird wie folgt genehmigt:

Erik Schmausser, Stadtrat Ressort Tiefbau (Vorsitz)
Rosmarie Quadranti, Stadträtin Ressort Hochbau
Dieter Fuchs, Leiter Tiefbau
Lukas Steudler, Leiter Hochbau
Primoz Hocevar (Projektleiter, beratend)
- Das Projekthandbuch, Version 2.3, wird zur Kenntnis genommen.



BESCHLUSS

VOM 11. JULI 2024

GESCH.-NR. 2023-0492

BESCHLUSS-NR. 2024-147

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Islertec AG, General-Guisan-Strasse 47, Postfach 2089, 8401 Winterthur
 - b. Stadtrat Ressort Tiefbau
 - c. Stadträtin Ressort Hochbau
 - d. Abteilung Tiefbau
 - e. Abteilung Hochbau

Stadtrat Illnau-Effretikon

Marco Nuzzi
Stadtpräsident

Peter Wettstein
Stadtschreiber

Versandt am: 16.07.2024
